	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001277

Client : BIT Site : Mme Coumba RIVIERA 3 N° OT : 019963

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 03/06/26 Heure Arrivée 08h18 Heure Départ 10h00
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☒	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 TIA DOUIN
2 Djemelehou
3
4
5
6

Description des travaux

Suite a la demande du client pour un non demarrage du GE FRAMAC 3B200 TFAK02 120KVA apres Coupure de l'electricite
Verifications/Controles mecaniques et electriques

Résultat des travaux (après intervention)

Constat de pompe d'amorçage (Graudline) defaillante

Travaux à prévoir

La pompe d'amorçage a remplacer en urgence
Vidange du moteur a faire et remplacer les elements filtrant

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien


CH = 313,8h / Gasoil 50%
GE à l'arrêt

Observations du client

Date : 10-06-2026	Date : 03/06/26	Date : 10/06/2026
Nom du client :	Nom du technicien :	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
S.A.S. au capital de 100 000 000 FCFA, Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tél : 225 27 212 300 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel .: +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

Scanné avec CamScanner

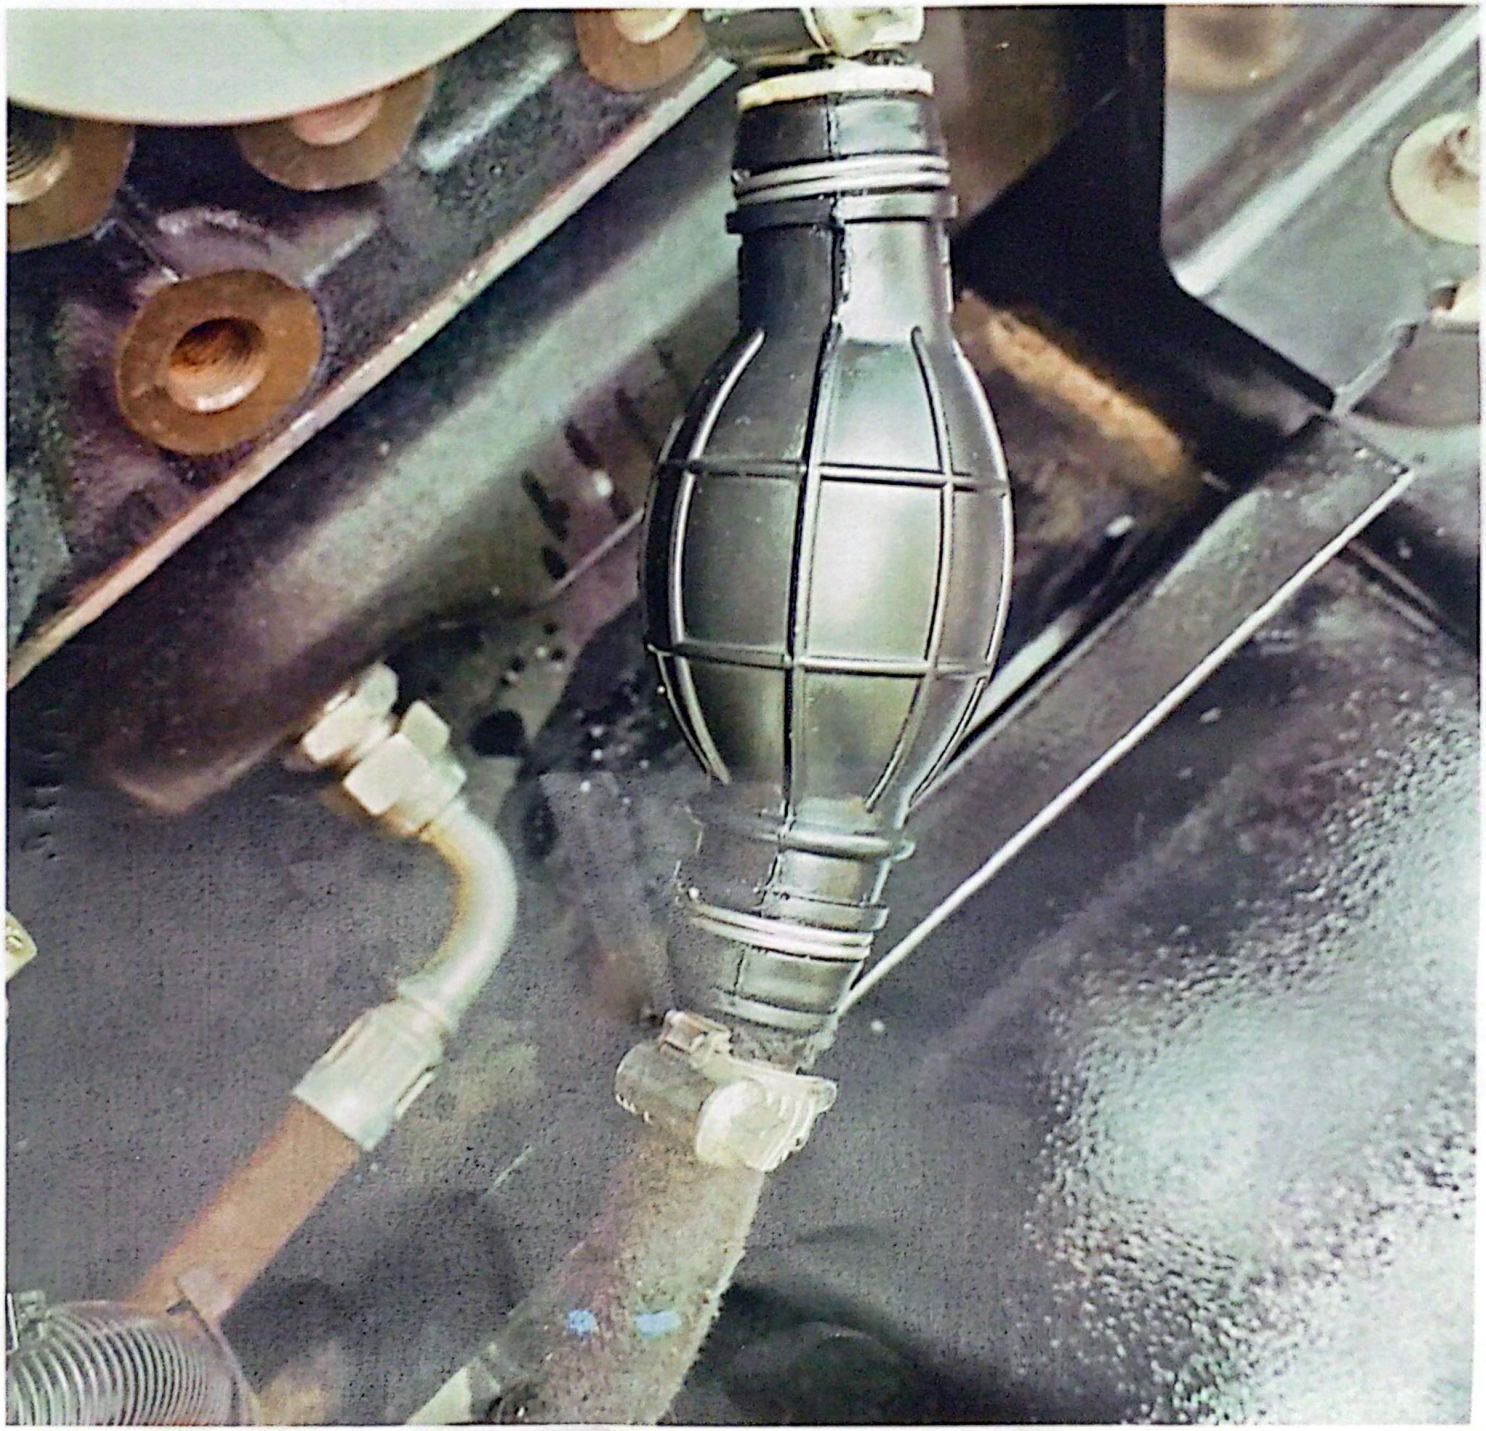

Scanné avec CamScanner
